ETH ARGE HPQ

4- Wochenprogramm Tiefbau / Hochbau

13.06.2024

Schlechtwettertage sind nicht enthalten und verlängern entsprechend die Bauzeit.

Monat	Juni							Juni							Juli							Juli						
KW	25							26							27							28						
Tag	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
Datum	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	13.	14.

Arbeiten	Dauer	Bemerkungen
Baustelleneinrichtung		
Anlieferung Ost: New Jersey Element versetzen und Fundation ergänzen		
Anlieferung Ost: Walzbeton einbringen		
Kranmontage Kran Nr.1		
Installationskanal Anlieferung		
Wände Et. 5C		
Wände / Stützen Et. 6		
Stützmauer Ost		
Stützmauer West		
Decke Et.5		
Sickerleitungen verlegen / Hinterfüllungsarbeiten		
Anlieferung Bereich Stützmauer Ost		
Baugrubenentwässerung		
Filterbrunnen Nr. 1 - 6 anpassen auf 3. Aushublage		
Aussteifung Baugrube		
Montage mit Aussteifung 3. Lage		
Aushub 3. Lage		
Aushubarbeiten		
Betonlongarine 3. Lage		
Schlitzwandfläche bearbeiten, Holzeinlagen entfernen Betonlongarine schalen, bewehren und betonieren		
Baustellenabwasserbehandlung		
Betrieb Anlage ETH und Wolfgang-Pauli Strasse		

Inventar	Dauer	Bemerkungen
Marti TB: RpBg 22to		
Marti TB: RpBg 9to		
EBAG Bagger, rp -30 to		
EBAG Bagger, pb -18 to		
EBAG Bagger, rp -5 to		
EBAG Kompaktlader		
EBAG Bulldozer		
EBAG Radlader mit Strassenreinigungsbürste		
EBAG Sennenbogen		
Barmettler EWS-Bohrinstallation		

Lärm	Dauer	Bemerkungen
Stufe 1 = Normal		
Stufe 2 = Erhöht		Stundenweise Fräs- und Spitzarbeiten SW
Stufe 3 = Hoch		

Anlieferung: Etappierung Bodenplatte/Wände

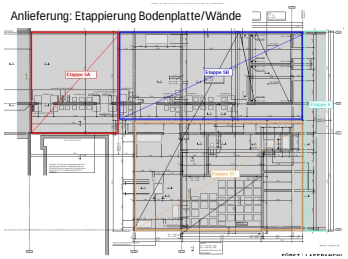

Baugrube: 3. Sprieslage

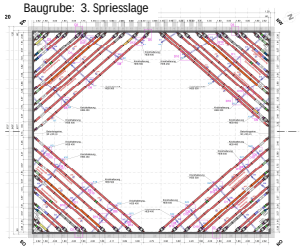

Anlieferung: Etappierung Decke
